

Correções CJT

Andamento da implementação do Sistema de Certidões (IGC-SP) a partir do documento de 16/09/2026

Posição em 07/10/2026 · branch feat/portal-correcoes-cjt · 6 fases de backend entregues, 4 planejadas

Panorama geral

O documento do cliente (Correções CJT_2026-09-16.pdf) traz **29 pedidos**. Esta página mostra onde estamos.

29

pedidos no documento inicial

19

atendidos (66%)

3

atendidos em parte

6


faltam atender

1

sem definição (página em branco)

10

entregas além do documento

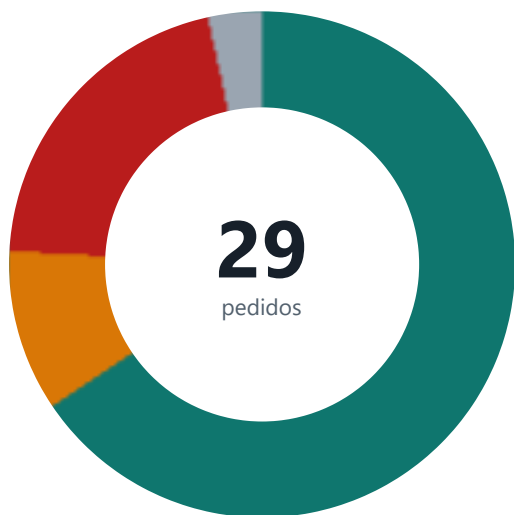

- **19** atendidos
- **3** atendidos em parte
- **6** faltam atender
- **1** sem definição do cliente

Dos 6 que faltam, 2 dependem de decisão do cliente (cores e logos, e confirmação do cadastro) e 4 estão planejados nas fases 7, 8 e 9.

Quanto de cada tipo de trabalho

Os 19 pedidos atendidos



Os 29 pedidos, atendidos ou não



■ só front · ■ front e back · ■ só back · ■ cliente

Nenhum pedido do documento foi só de backend entre os atendidos

12

pedidos que exigem backend e frontend juntos (6 já atendidos e 6 em parte ou faltando)

89

testes automatizados novos sobre as regras do formulário, chat, estados e protocolo

Como contamos: pedido = cada item do documento (páginas 2 a 9; a página 10, "Bloco 2 – Recebimento DDD", está em branco). "Atendido em parte" = parte do pedido funciona e parte falta.

O que atendemos

19 pedidos do documento. A coluna do meio mostra se foi preciso trabalho só de frontend ou de frontend e backend.

#	PEDIDO DO CLIENTE	ATUAÇÃO	ONDE / COMO
NOVA REQUISIÇÃO			
3	Parágrafo sobre a CJT e avisos antes de iniciar	Só front	Introdução da Nova Requisição
4	Caixas que liberam conforme o preenchimento e barra de evolução	Só front	Formulário em 4 caixas com progresso
5	Representante informa CPF ou CNPJ de quem representa	Front e back	Tela antes; validação no servidor na Fase 3
6	Cenários Matrícula, Gleba e Área ao lado das opções	Só front	Dicas na Pergunta 2
7	Ramificação de Usucapião ("Quero informar o número da matrícula?")	Front e back	Fase 3: pergunta 3.1 e matrícula travada
8	Explicações acima do campo, rótulos em negrito e sem SNCR	Só front	Pergunta 4
9	Espólio de xxxx ; Outros, sem S/M e S/E, matrícula sem CRI	Só front	Textos de orientação
10	"Nome de cada polígono"	Só front	Rótulo atualizado
11	Alerta de atenção a partir de 6 polígonos	Só front	Aviso na quantidade
12	13 ou mais polígonos: pedido vai à DDD, congela e libera o chat	Front e back	Fase 5: congelar e liberar
13	Nomenclatura fechada (Gleba, Parte, Parcela; complemento de 3 caracteres)	Front e back	Tela antes; servidor na Fase 3
14	Ver a imagem do polígono do imóvel	Só front	Mapa; só imóveis do acervo importado
16	Novo texto da declaração	Só front	Finalização
17	Tela "Solicitação enviada com sucesso"	Só front	O chat citado agora existe
18	Cliente só edita depois da devolução pela DDD	Front e back	Fase 2: ação Devolver com motivo
ACOMPANHAR REQUISIÇÃO			
25	Box com o número SEI	Só front	Número digitado no backoffice
26	Box Imóvel sem município, com nomes e quantidade de polígonos	Só front	Detalhe da requisição
27	Status visíveis na box de acompanhamento	Só front	6 etapas com subetapa técnica
28	Chat da solicitação	Front e back	Fase 1: chat nos dois lados

Estão em "atendidos em parte" os pedidos #15, #21 e #22; em "faltam", os #1, #2, #19, #20, #23, #24 e #29. Os números seguem a ordem do documento.

Além do documento

Entregas que o documento do cliente não pedia, mas que o projeto precisou ou que pendências do time pediam. Tudo está documentado em docs/.

ENTREGA	ATUAÇÃO	PENDÊNCIA	COMMIT
Edição do processo no backoffice Expediente SEI, técnico, conferente, datas e taxas, em página própria	Só front	#PEND-5	881f6c1
Corte de divisas no menu e ligado ao processo Item de menu e botão no processo, com a parcela já carregada	Só front	#PEND-7	f2557f1
Remoção do modo escuro Texto da certidão ficava ilegível com o tema escuro do sistema	Só front	—	5a6b861
Máscaras de CPF, CNPJ e telefone Em login, cadastros, clientes e processos; envio sem mudar o contrato da API	Só front	#PEND-41	f5cd66e
Contraste dos textos auxiliares Nove textos abaixo do mínimo AA corrigidos	Só front	#PEND-40	9a40c15
Largura no celular Nomes longos e campo de espólio não estouram mais a página	Só front	—	3973d57
Fundação do backend de requisições Estados únicos, protocolo sem número repetido, autenticação padronizada	Só back	—	a0fd7ed
Testes automatizados Vitest instalado: 89 testes sobre as regras do formulário, chat, estados e protocolo	Só back	#PEND-24	a0fd7ed
Bloqueios por situação da requisição Requisição devolvida, rascunho ou congelada não abre processo nem registra pagamento	Front e back	—	400e9a2
Documentação e registro de pendências 4 documentos em docs/ e 51 pendências registradas, com responsável e prioridade	Documentação	—	docs/

6 · 2 · 1 · 1

só front · só back · front e back · documentação

51

pendências registradas: 16 resolvidas, 3 descartadas e 32 abertas

Documentação em docs/

- correcoes-cjt-portal.md — os 16 itens do portal do solicitante (pedido, arquivo, URL, decisões).
- melhorias-frontend-backoffice.md — edição do processo, corte de divisas, máscaras, contraste, modo escuro, merge.
- atendimento-cjt-pedidos-restantes.md — fases 0 a 5 de backend: chat, devolver, usucapião, rascunho, 13 polígonos (decisões, APIs, banco, testes, limites).

Atendidos em parte

3 pedidos em que parte já funciona. Cada cartão mostra o que está pronto, o que falta e a fase prevista.

#15 Front e back

Fase 6

Indicar quem é cada gleba e unir quantidade e nomes à tela do Imóvel

Já feito: A lista de nomes aparece ao lado do mapa do imóvel e a nomenclatura é validada.

Falta: Ligar cada nome a uma parcela do mapa, com cor e rótulo, e guardar esse vínculo.

#21 Front e back

Fase 8

Status Geral em Minhas Requisições (5 grupos)

Já feito: Funcionam: Não enviadas (rascunho), Em análise, Devolvidas e Concluídas.

Falta: Arquivadas, que depende do pedido de arquivamento.

#22 Só back

Fase 9

Status da requisição em 6 etapas e subetapas

Já feito: As 6 etapas aparecem, derivadas dos dados do processo, com a subetapa técnica.

Falta: Subetapas do Atendimento (checagem de documentos, liberação do SEI), a expedição, e refletir devolvida, congelada e arquivada.

Faltam atender

6 pedidos sem entrega, mais o Bloco 2, que está em branco no documento.


#	PEDIDO	ATUAÇÃO	QUANDO	O QUE FALTA
1	Mudar todas as cores para a cartela do IGC	Só front	Cliente	Falta o cliente definir a cartela de cores e os logos (#PEND-38).
2	E-mail (ou SMS) para finalizar o cadastro	Front e back	Cliente	Falta definir o que é a confirmação do contato (#PEND-37).
19	Rodar a análise de duplicidade às 12:00 e 00:00	Só back	Fase 7	Agendador dentro do app, idempotente, com botão para rodar na hora.
20	Duplicidade em 4 situações (perguntas no chat, sinalização à DDD)	Front e back	Fase 7	Usa o chat já pronto; precisa da regra de comparação de áreas e dados.
23	Nível de complexidade de 1 a 9	Front e back	Fase 9	Sugestão pelo corte, técnico confirma; falta o dado "divisa finalizada" por linha.
24	Botão para solicitar arquivamento (regra de custo e tempo)	Front e back	Fase 8	Arquiva na hora se não houve análise; senão vai à DDD decidir.
29	Bloco 2: Recebimento DDD (em análise)	Cliente	Cliente	A página do documento está em branco; falta o conteúdo.

Linha do tempo e próximos passos

Cada fase com tela teve proposta visual aprovada, verificação no navegador e um commit.

Fase 0	Fundação	Só back	a0fd7ed
Fase 1	Chat da solicitação	Front e back	f776cfd
Fase 2	Devolver requisição	Front e back	400e9a2
Fase 3	Usucapião, nomenclatura, representante	Front e back	588d293
Fase 4	Rascunho e Não enviadas	Front e back	35847a9
Fase 5	13 ou mais polígonos	Front e back	8790a1b
Fase 6	Nome ↔ parcela do mapa	Front e back	#PEND-34, #PEND-45
Fase 7	Análise de duplicidade (12h e 0h)	Front e back	#PEND-30
Fase 8	Arquivamento	Front e back	#PEND-29
Fase 9	Status por etapa e complexidade	Front e back	#PEND-27, #PEND-32

Pendências do projeto (51)

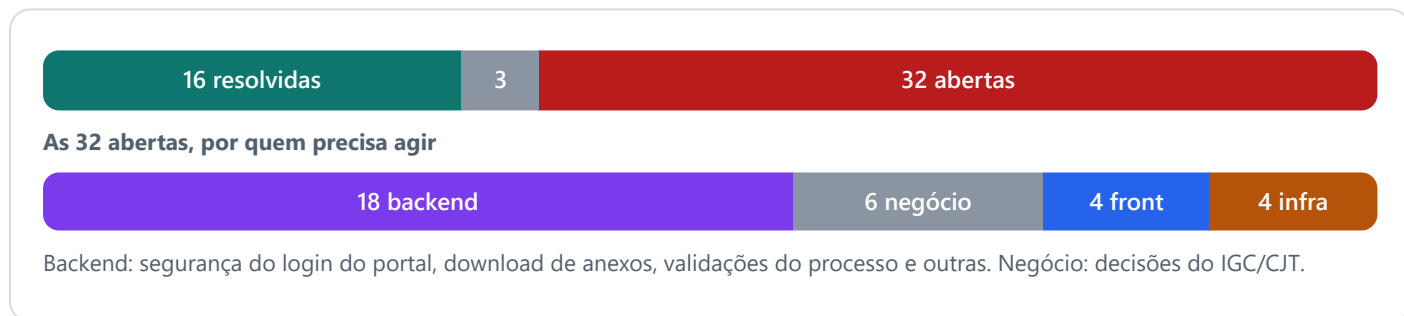

Fora do escopo por falta de definição ou de dono

Cores e logos do IGC e e-mail ou SMS no cadastro: aguardam o cliente (#PEND-38, #PEND-37).

Bloco 2 – Recebimento DDD: a página do documento está em branco.

Integração com o SEI e com a b-Cadastro: adiada. O e-mail do Suporte Integrador descreve só o pedido de acesso (processo SEI de acordo bilateral, credencial do IDP); falta o contrato das APIs e o que a integração com o SEI deve fazer (#PEND-50, #PEND-51). As perguntas para o Sandro seguem na mensagem que acompanha este documento.

Atenção para a produção: as 4 migrations novas são só do PostgreSQL e precisam ser conferidas em staging (ordem contra a migration 9999_postgis_geometry). O agendador da fase 7 não precisa de infra nova, mas a variável do token externo (CRON_TOKEN) ficará como pendência de infra.
